


ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Kv 4, 2018			Kv 1, 2019			Kv 2, 2019			Kv 3, 2019			Kv 4, 2019			Kv 1, 2020		
						okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar
1	Prosjektstart	1 dag	ma 04.02.19	ma 04.02.19																			
2	Fase 0 - Prosjektetablering	20 dager	ma 04.02.19	fr 01.03.19																			
3	Planlegging	20 dager	ma 04.02.19	fr 01.03.19																			
4	Planlegge fase 0 og prosess 1.1	2 ukr	ma 04.02.19	fr 15.02.19	1SS;5AA																		
5	Gjennomgang og godkjenning av plan for fase 0 og prosess 1.1	1 dag	fr 15.02.19	fr 15.02.19																			
6	Når plan for fase 0 og prosess 1.1 er godkjent	0 dager	fr 15.02.19	fr 15.02.19	4																		
7	Planlegge resten av fase 1 og grovplanlegge fase 2	2 ukr	ma 18.02.19	fr 01.03.19	6																		
8	Når plan for fase 0 og 1 er lagt og klare for presentasjon i styringsgruppa	0 dager	fr 01.03.19	fr 01.03.19	7																		
9	Kartlegge status	10 dager	ma 11.02.19	fr 22.02.19																			
10	Kartlegge og oppsummere status etter forrige prosjektgjennomføring	2 ukr	ma 11.02.19	fr 22.02.19	4SS+1 uk																		
11	Når kartlegging av dagens status er dokumentert	0 dager	fr 22.02.19	fr 22.02.19	10																		
12	Når prosjektetablering er gjennomført	0 dager	fr 22.02.19	fr 22.02.19	10																		
13	Fase 1	111 dager	ma 25.02.19	ma 30.09.19																			
14	Prosess 1.1 - Tilpasning GDPR	20 dager	ma 25.02.19	fr 22.03.19																			
15	Behov/konseptarbeid	10 dager	ma 25.02.19	fr 08.03.19																			
16	Gjennomføre behovskartlegging og utarbeide løsningsbeskrivelse med bakgrunn i analyse gjennomført av juss	1 uk	ma 25.02.19	fr 01.03.19	12																		
17	Gjennomgang av førsteutkast til løsningsbeskrivelse med utviklere	1 uk	ma 25.02.19	fr 01.03.19	16SS																		
18	Når førsteversjon av løsningsbeskrivelse er utarbeidet	0 dager	fr 01.03.19	fr 01.03.19	16;17																		
19	Justere og ferdigstille løsningsbeskrivelse	1 uk	ma 04.03.19	fr 08.03.19	18																		
20	Styringsgruppemøte	1 uk	ma 04.03.19	fr 08.03.19	19SS;8																		
21	Når løsningsbeskrivelsen er godkjent	0 dager	fr 08.03.19	fr 08.03.19	19;20																		
22	Implementasjon	10 dager	ma 11.03.19	fr 22.03.19																			
23	Implementere tilpasninger etter GDPR i henhold til løsningsbeskrivelse	1 uk	ma 11.03.19	fr 15.03.19	21																		
24	Når tilpasninger etter GDPR er implementert i Helseforsk i henhold til skisser	0 dager	fr 15.03.19	fr 15.03.19	23																		
25	Teste og justere etter implementasjon	1 uk	ma 18.03.19	fr 22.03.19	24																		
26	Når tilpasninger etter GDPR er justert i Helseforsk etter testing og godkjent	0 dager	fr 22.03.19	fr 22.03.19	25																		
27	Prosess 1.2 - Tilpasning alle forskningsprosjekter UiO	101 dager	ma 11.03.19	ma 30.09.19																			
56	Når fase 1 av prosjektet er avsluttet	0 dager	ma 30.09.19	ma 30.09.19	26;49;51;5																		
57	Fase 2	140 dager	ma 05.08.19	fr 14.02.20																			

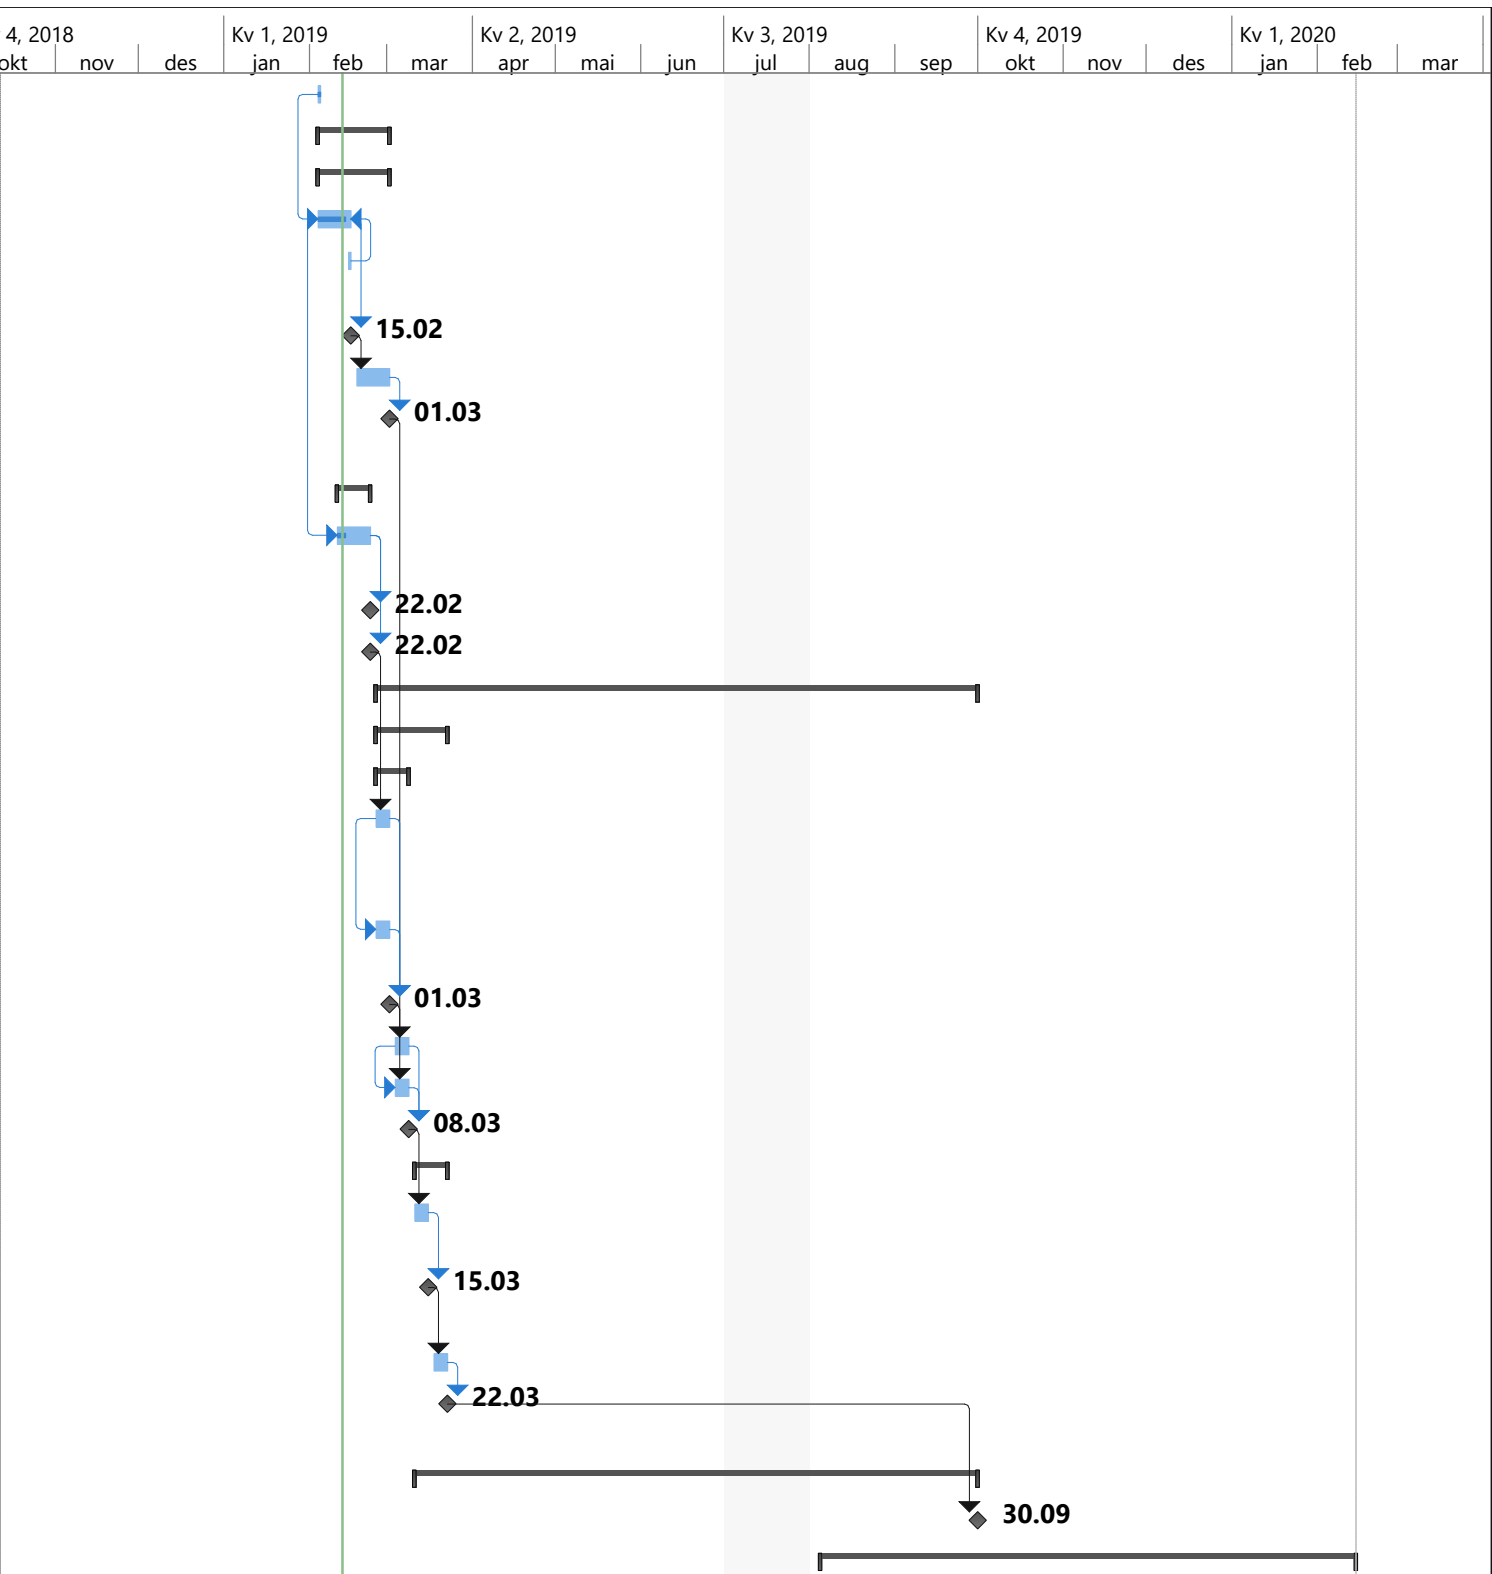

Prosjekt: Prosjektplan Dato: on 13.02.19	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
