


# CHANGING THE CONTRACT

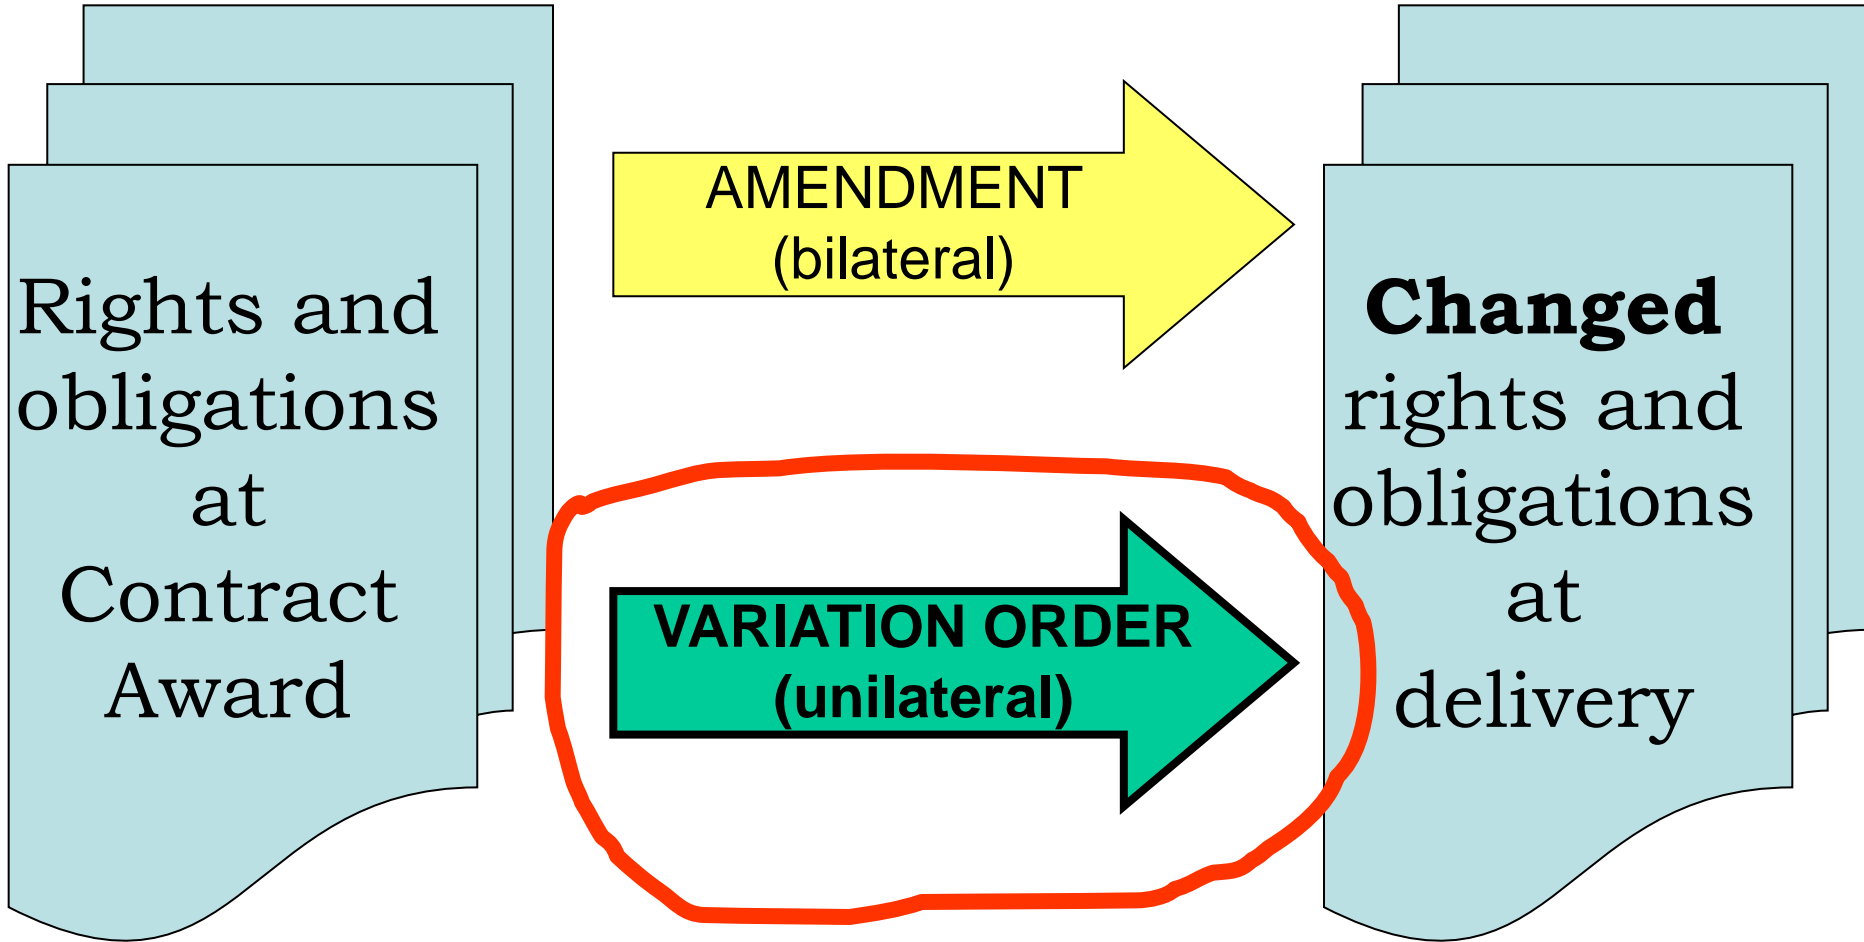

# HENSYN og BALANSE

## BESTILLER

”Nøtteskallet”:

Riktig ting til riktig tid

- Vid instruksjonsadgang
- ”Hoppeplikt” for leverandøren

## LEVERANDØR


”Nøtteskallet”:

Få kompensert

- Iverksettelse betinget av avtale om virkninger
- *Subsidiært*:  
Kontraktssystem som sikrer
  - adekvat kompensasjon
  - som er rimelig tilgjengelig

### **BALANSERINGEN: Kontraksregler om**

- **kompensasjonsnivå (tid / pris)**
- **prosdyrer for å få kompensasjon**
  - ved tvist om hvorvidt situasjonen krever kompensasjon
  - ved tvist om kompensasjonens omfang

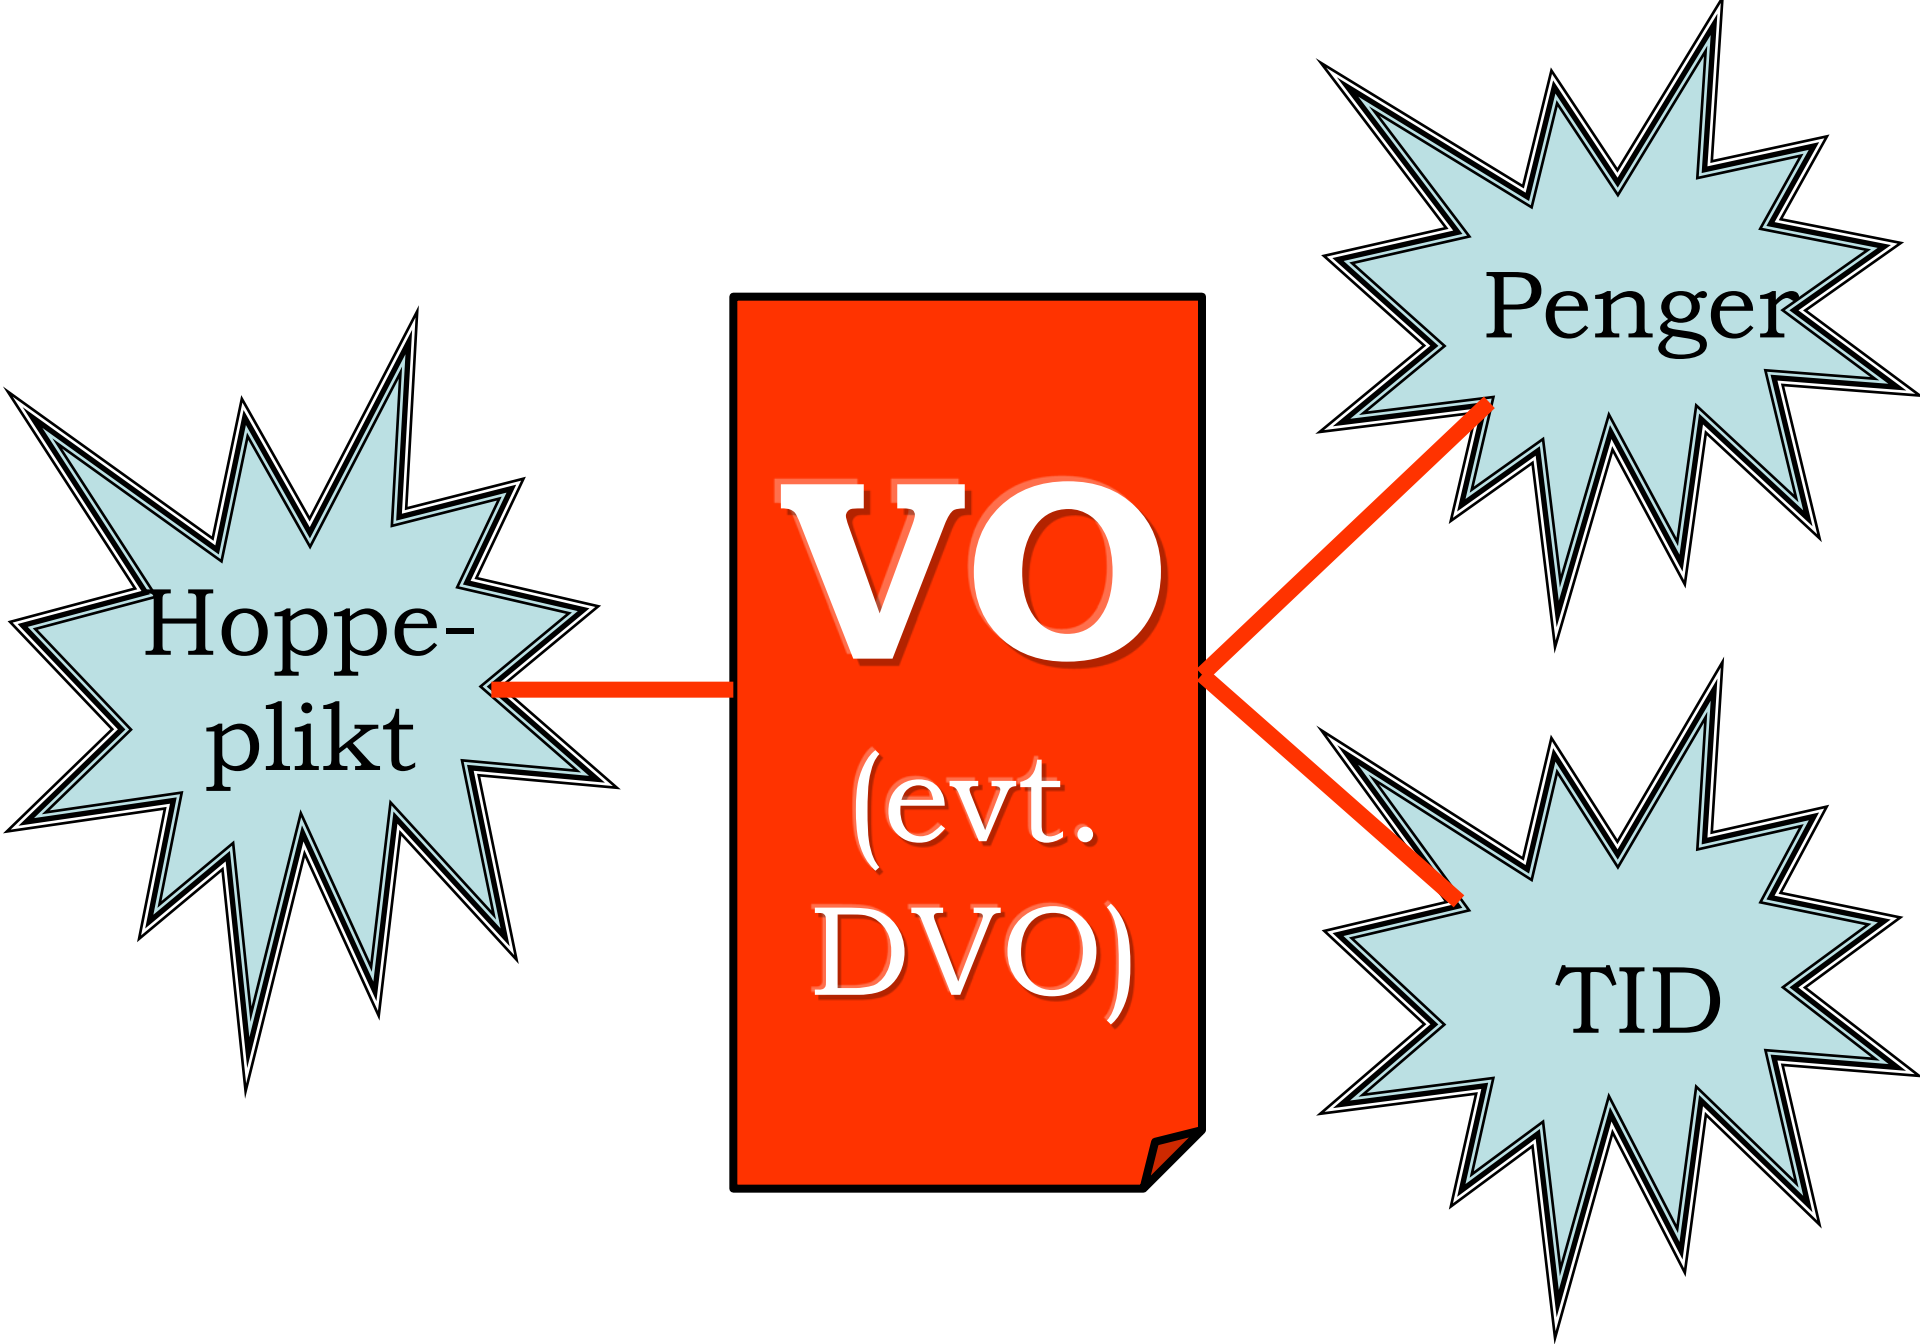

# Endringsordre: Når ?

Plikt til å utstede

**TILLEGGS-  
ARBEID**

Leverandøren fremmer *ikke* VOR

"uten ugrunnet opphold"

TID

(Angivelig utenfor SoW)


Ingen  
VOR

Ingen  
VO

LIKEVEL  
**ARBEIDSPLIKT**

# Endringsordre: Når ?

Plikt til å utstede

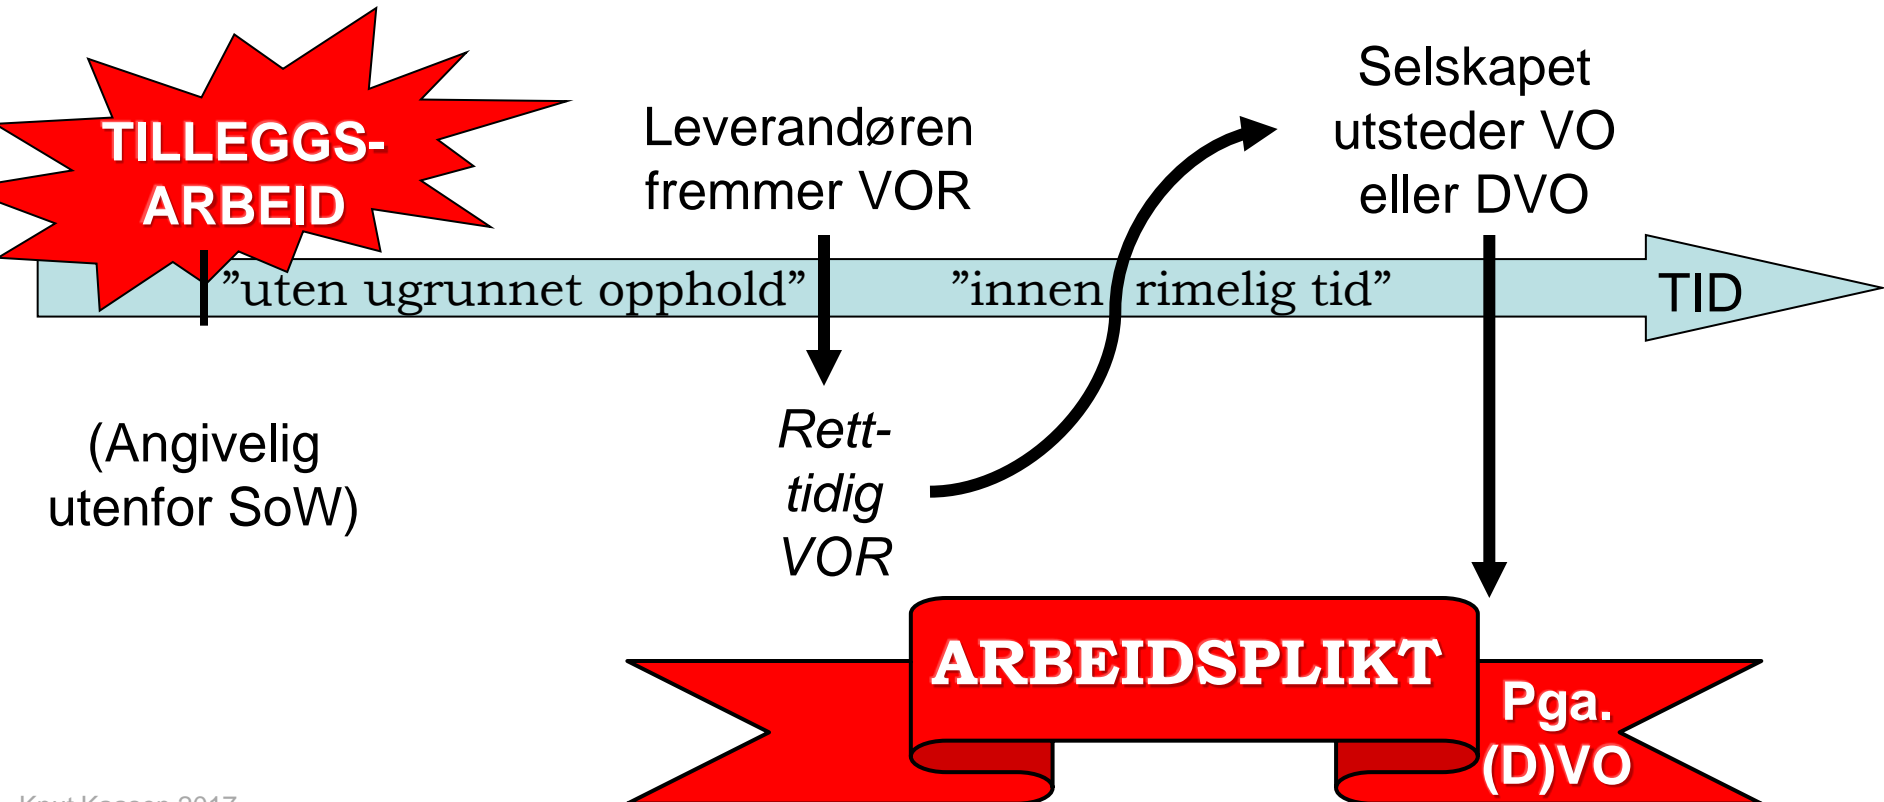

NE 05


# Formløst instruks fra selskapet

**ENDRING**  
av  
**arbeids-  
omfang**

**OPPRIN-  
NELIG**  
arbeids-  
omfang

**Dvs.:**  
-Plikt til å iverksette  
- Mulig tilleggs-  
vederlag  
- Mulig endring i fremdrifts planen


**Dvs.:**  
-Plikt til å iverksette  
- Intet tilleggs-  
vederlag  
- Ingen endring i fremdrifts planen

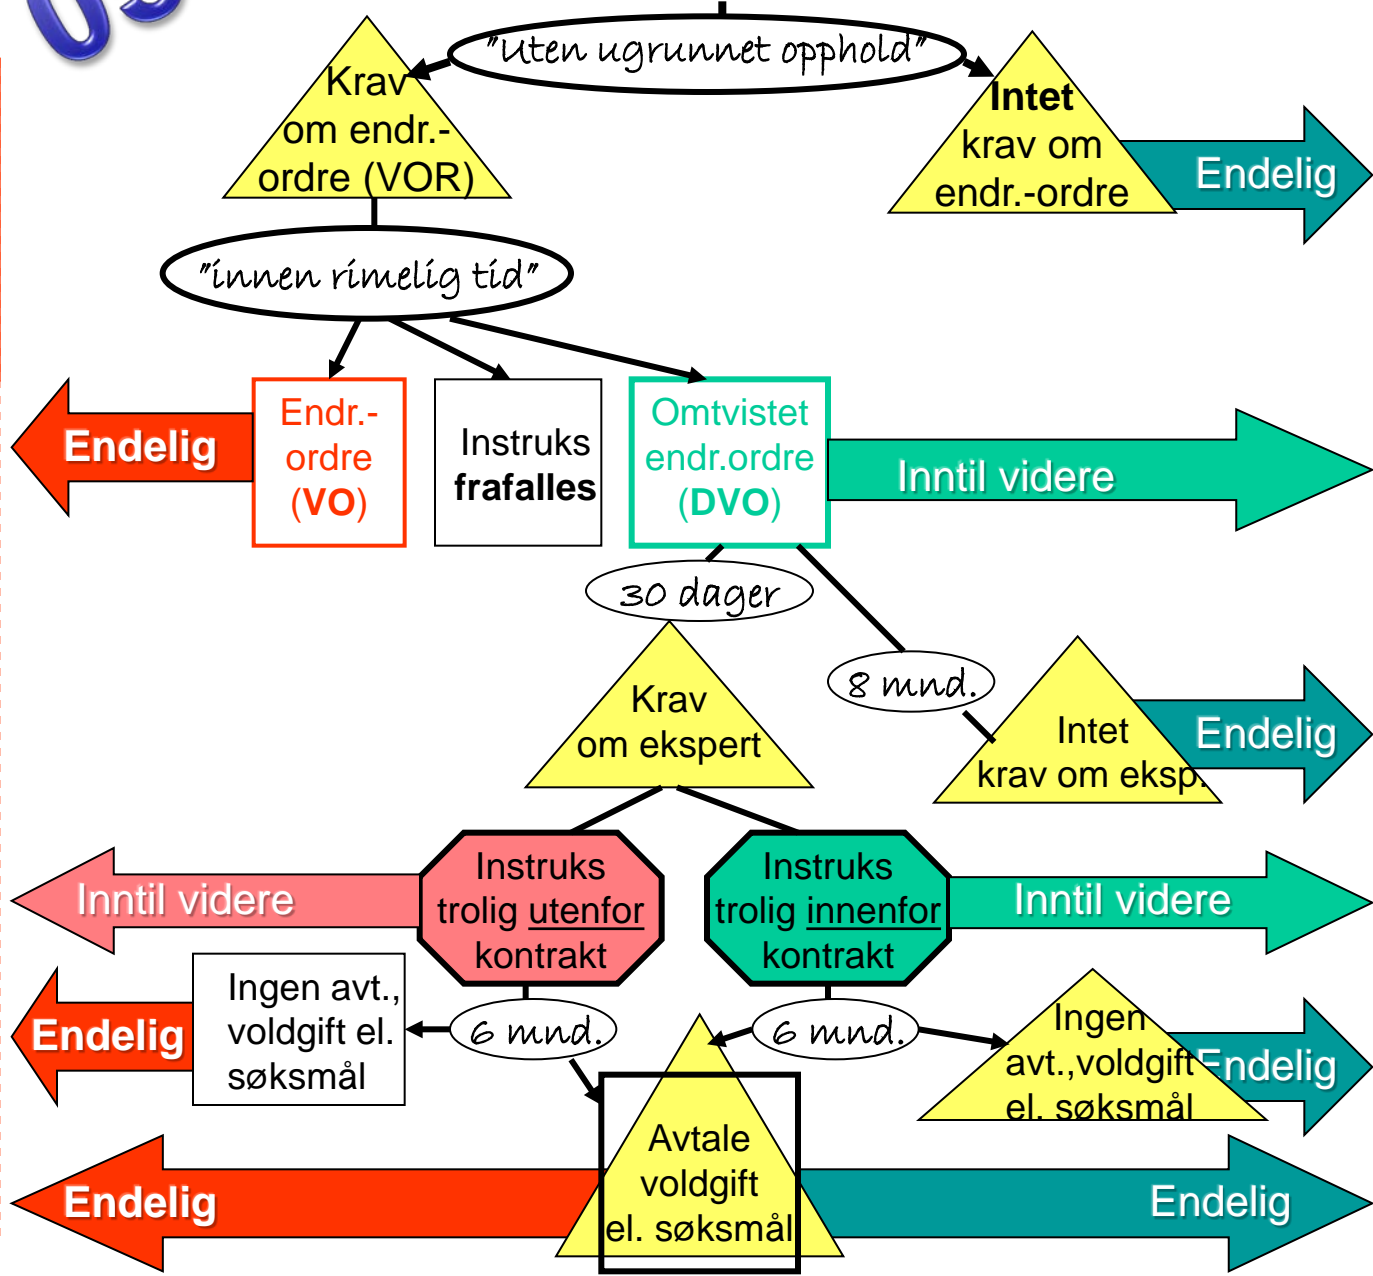

NEF 15

Skriftlig instruks fra selskapets representant

ENDRING av arbeidsomfang

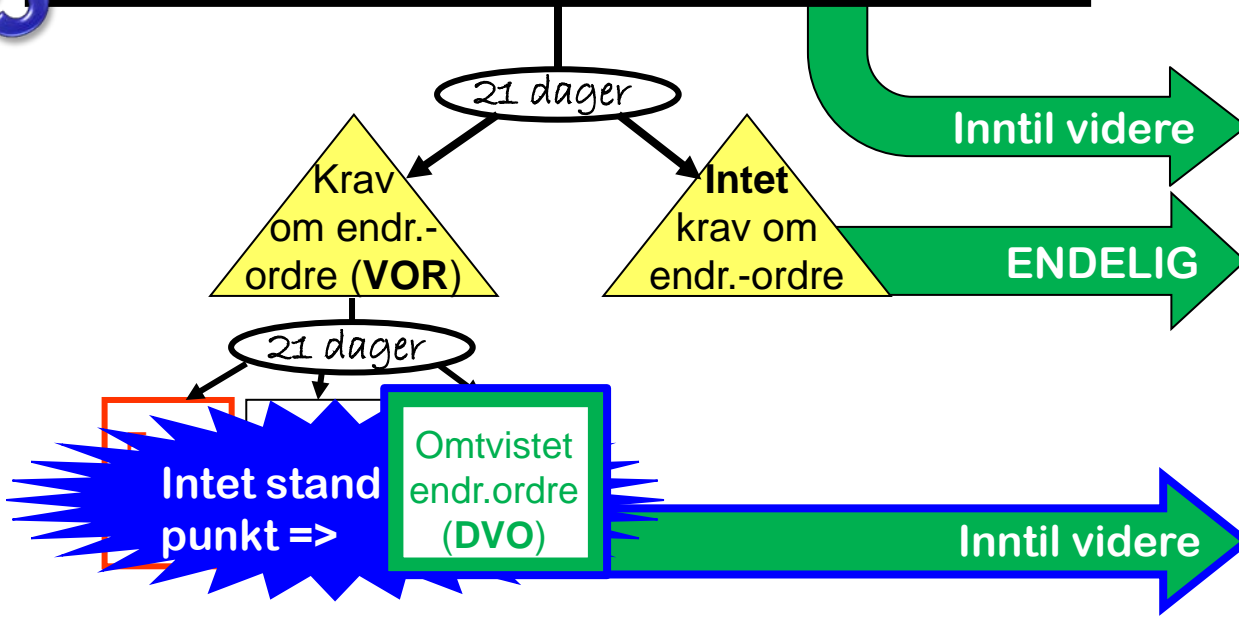

OPPRINNELIG arbeidsomfang

Dvs.:

- Plikt til å iverksette
- Mulig tilleggsvederlag
- Mulig endring i fremdriftsplanen

Dvs.:

- Plikt til å iverksette
- Intet tilleggsvederlag
- Ingen endring i fremdriftsplanen
